


Kita Spielhaus

Aktuelle Informationen zum Erweiterungsbau Kita Spielhaus


Was ist passiert seit Aug. 2019

- **Sept. 18** Beschluss 2. Nachtragshaushalt 2017/2018
- **Sept. 18** Beschluss: Vergabe der Planungs- und Bauleistung an Modulbaufirma: KLEUSBERG, aus Hamburg
- **Nov. 18** Einreichung Bauantrag gem. Terminplan
- **Nov. 18** Zuwendungsbescheid der ILB liegt vor i.H.v. 961.186 EUR

Lageplan inkl. Projekteintrag

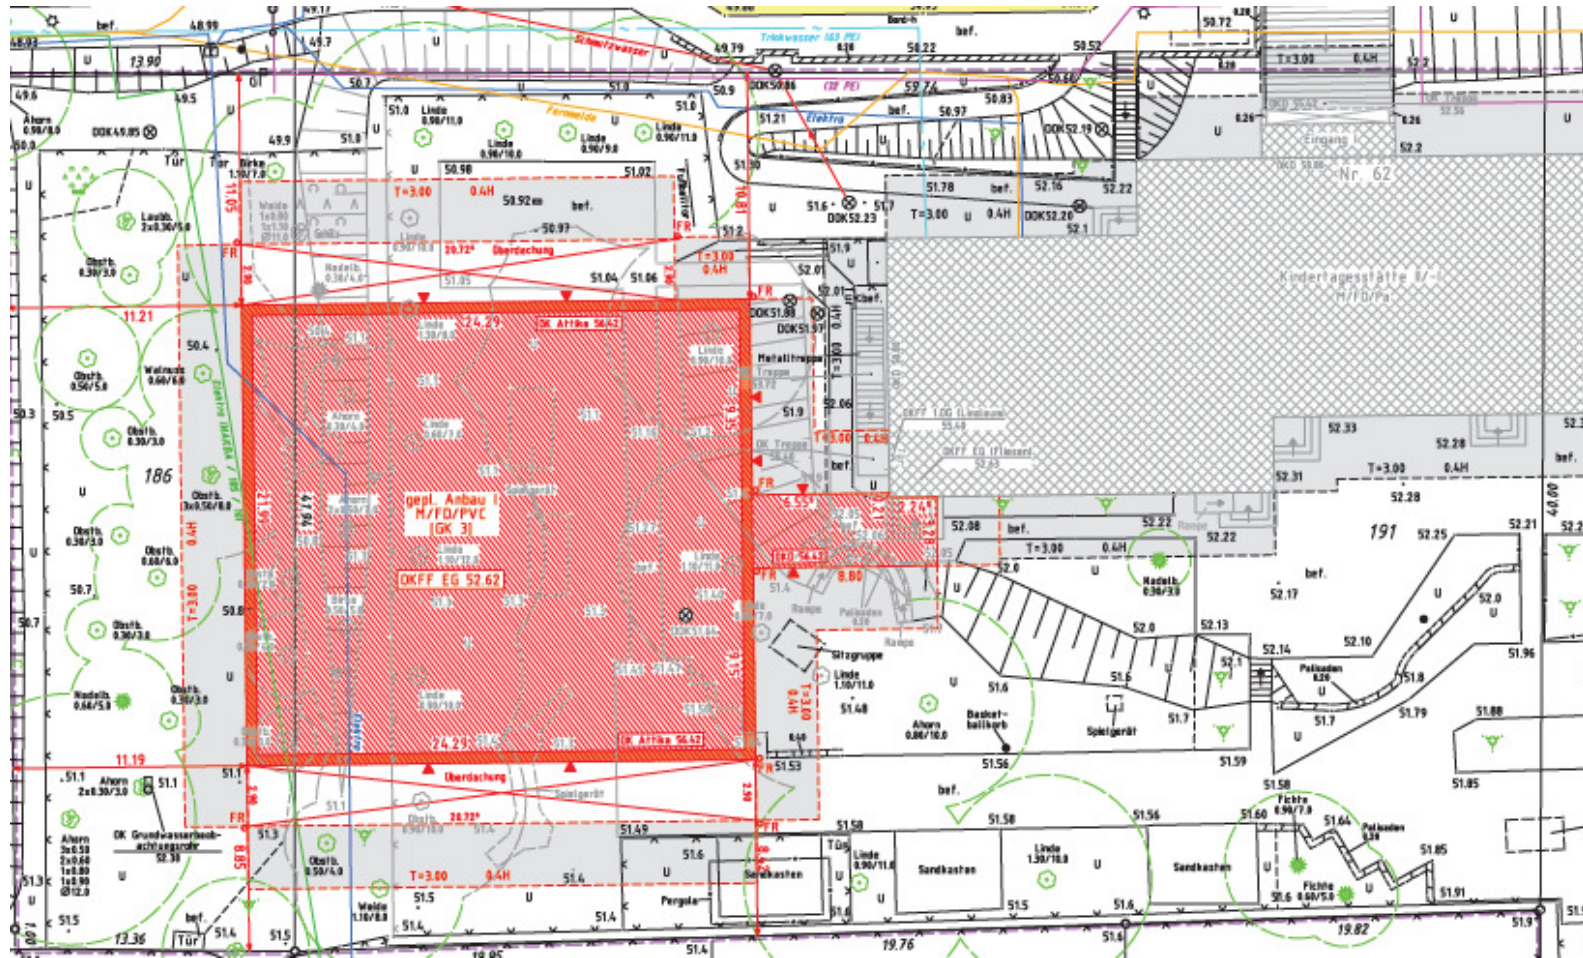

Aktueller Grundriss

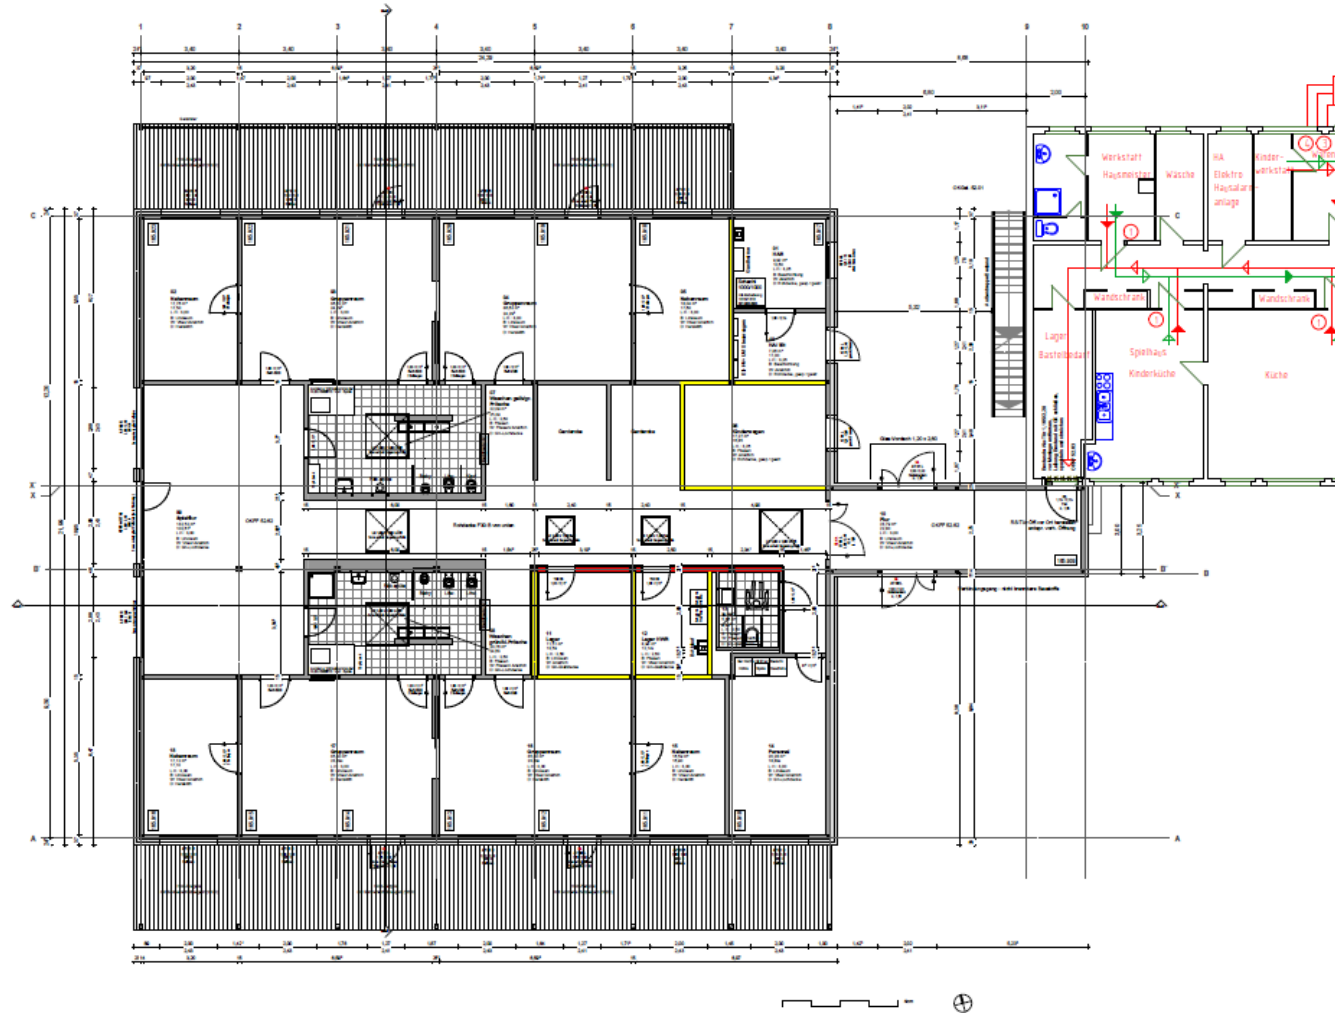

Die nächsten Schritte...

- **Februar 19**

 - Aufbau Bauzaun bis 9.KW/19

 - Baumfällung bis 9 .KW/19

 - Abbau Spielgeräte/Zaun etc. bis 11. KW/19

 - Abschluss Ausführungsplanung bis 13 KW/19

- **März 19**

 - Baustelleneinrichtung

 - Beginn Bodenarbeiten (Baufeld, Erd- und Stahlbauarbeiten) je nach Wetterlage)

Die nächsten Schritte...

- **April 19**

- 10. April 2019, 14:00 Uhr Grundsteinlegung
 - Durchführung Modulmontage (ca. 5 Tage)
 - Beginn Dacharbeiten
 - Beginn Innenausbau (Ende April 2019)

- **Mai 2019 – Juli 2019**

- Innenausbau
 - Fassadenmontage (Putz/ Trespa-Platten)
 - Terrasse
 - Bauabnahme 31.07.2019
