



Stand Tiefbaumaßnahmen 2012

Bushaltestelle R.-Breitscheid-Straße, Neuerrichtung

Vergabe: 05.12.2011

Baufirma: Wesebaum GmbH

Baubeginn: 10.12.2011

Bauende: 15.06.2012



Ligusterweg, Straßenbau, Beleuchtung, Trink- u. Abwasser

Baubeschluss: 16.02.2012

Vergabeentscheid: 22.03.2012

Baufirma: Tharo GmbH

Baubeginn: 03.04.2012

Bauende: 29.06.2012



Michaelisstraße, Straßenbau, Beleuchtung, Regenwasser

Baubeschluss: 16.06.2011

Vergabebeschluss: 22.09.2011

Baufirma: TSU GmbH

Stand:

1. BA 04.07.2011 – 10.05.2012

2. BA 10.05.2012 – 13.07.2012

Baubeginn: 27.10.2011

Bauende: 27.06.2012



Fußgängerbrücke Heegermühle, Belagserneuerung

Vergabe: 24.05.2012

**Baufirma: Schmees & Lühn GmbH
Fresenburg**

Baubeginn: 30.07.2012

Bauende: 17.08.2012



Regenentwässerung G.-Friedrich-Hegel-Straße, Erneuerung der Leitung

Vergabebeschluss: 21.06.2012

Baufirma:

Baubeginn: voraus. 02.07.2012

Bauende: 10.08.2012



Kupferhammerweg, Straßensanierung

Beschluss Vereinbarung: 24.05.2012

Vergabebeschluss: 21.06.2012

Baufirma:

Baubeginn: voraus.06.07.2012

Bauende: 31.08.2012



Schneiderstraße, Straßenbau, Beleuchtung, Regenwasser

Baubeschluss: 16.06.2011

Vergabebeschluss: 22.09.2011

Baufirma: Tharo GmbH

Baubeginn: 01.12.2011

Bauende: 31.08.2012



Buchenweg, Straßenbau, Beleuchtung, teilweise Regenwasser

Baubeschluss: 16.02.2012

Vergabebeschluss: 24.05.2012

**Baufirma: Angermünder
Straßen/Tiefbau GmbH**

Baubeginn: 18.06.2012

Bauende: 28.09.2012



Mozartstraße, Straßenbau, Beleuchtung, Regenwasser

Baubeschluss: 22.03.2012

Vergabebeschluss: 24.05.2012

**Baufirma: Engron
Straßen/Tiefbau GmbH**

Baubeginn: 02.07.2012

Bauende: 28.09.2012



Poratzstraße, Straßenbau, Regenwasser

Baubeschluss: 16.12.2010

Vergabebeschluss: 26.05.2011

**Baufirmen: Arbeitsgemeinschaft
Eurovia GmbH / TRP GmbH**


Baubeginn: 04.07.2011

Stand:1. BA 04.07.2011 - 30.03.2012

2. BA 05.03.2012 – 12.10.2012

ca. 2 Wochen Bauverzug,

Bauende: 12.10.2012

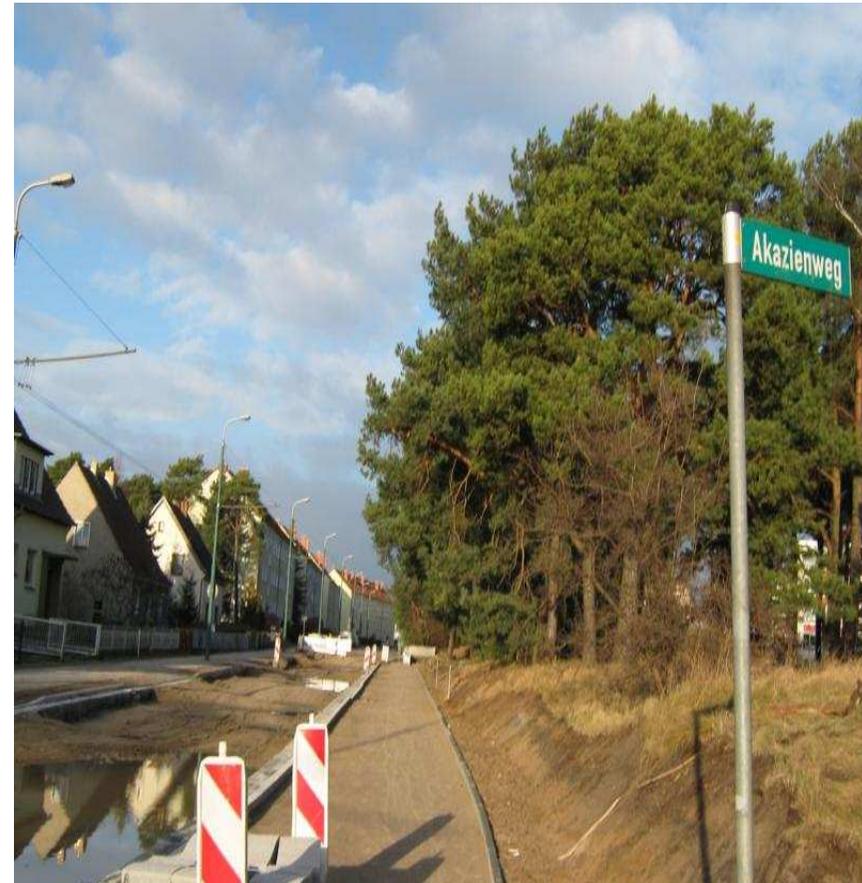

Kirchenhang, barrierefreie Wegeverbindung mit Grünfläche

Vergabebeschluss: 24.05.2012

Baufirma: Tharo GmbH

Baubeginn: 25.06.2012

Bauende: 31.12.2012



Straßenunterhaltung im Stadtgebiet

Vergabebeschluss: 22.09.2011

Baufirma: Wesebaum GmbH

Baubeginn: 01.01.2012

Bauende: 31.12.2012



Gehwegsanierung Los 1

Vergabebeschluss: 24.05.2012

Baufirma: Tharo GmbH

Baubeginn: 18.06.2012

Bauende: 31.12.2012



Gehwegsanierung Los 2

Vergabebeschluss: 24.05.2012

Baufirma: Wesebaum GmbH

Baubeginn: 18.06.2012

Bauende: 31.12.2012





Ende der Präsentation

**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**
