


Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme Heizung Zoo

ABPU am 11.09.2012

Inhalt



- 1. Stand der Arbeiten nach Gewerken / Losen**
- 2. Technische Änderungen**
- 3. Kostenentwicklung**
- 4. Stand Förderantrag**

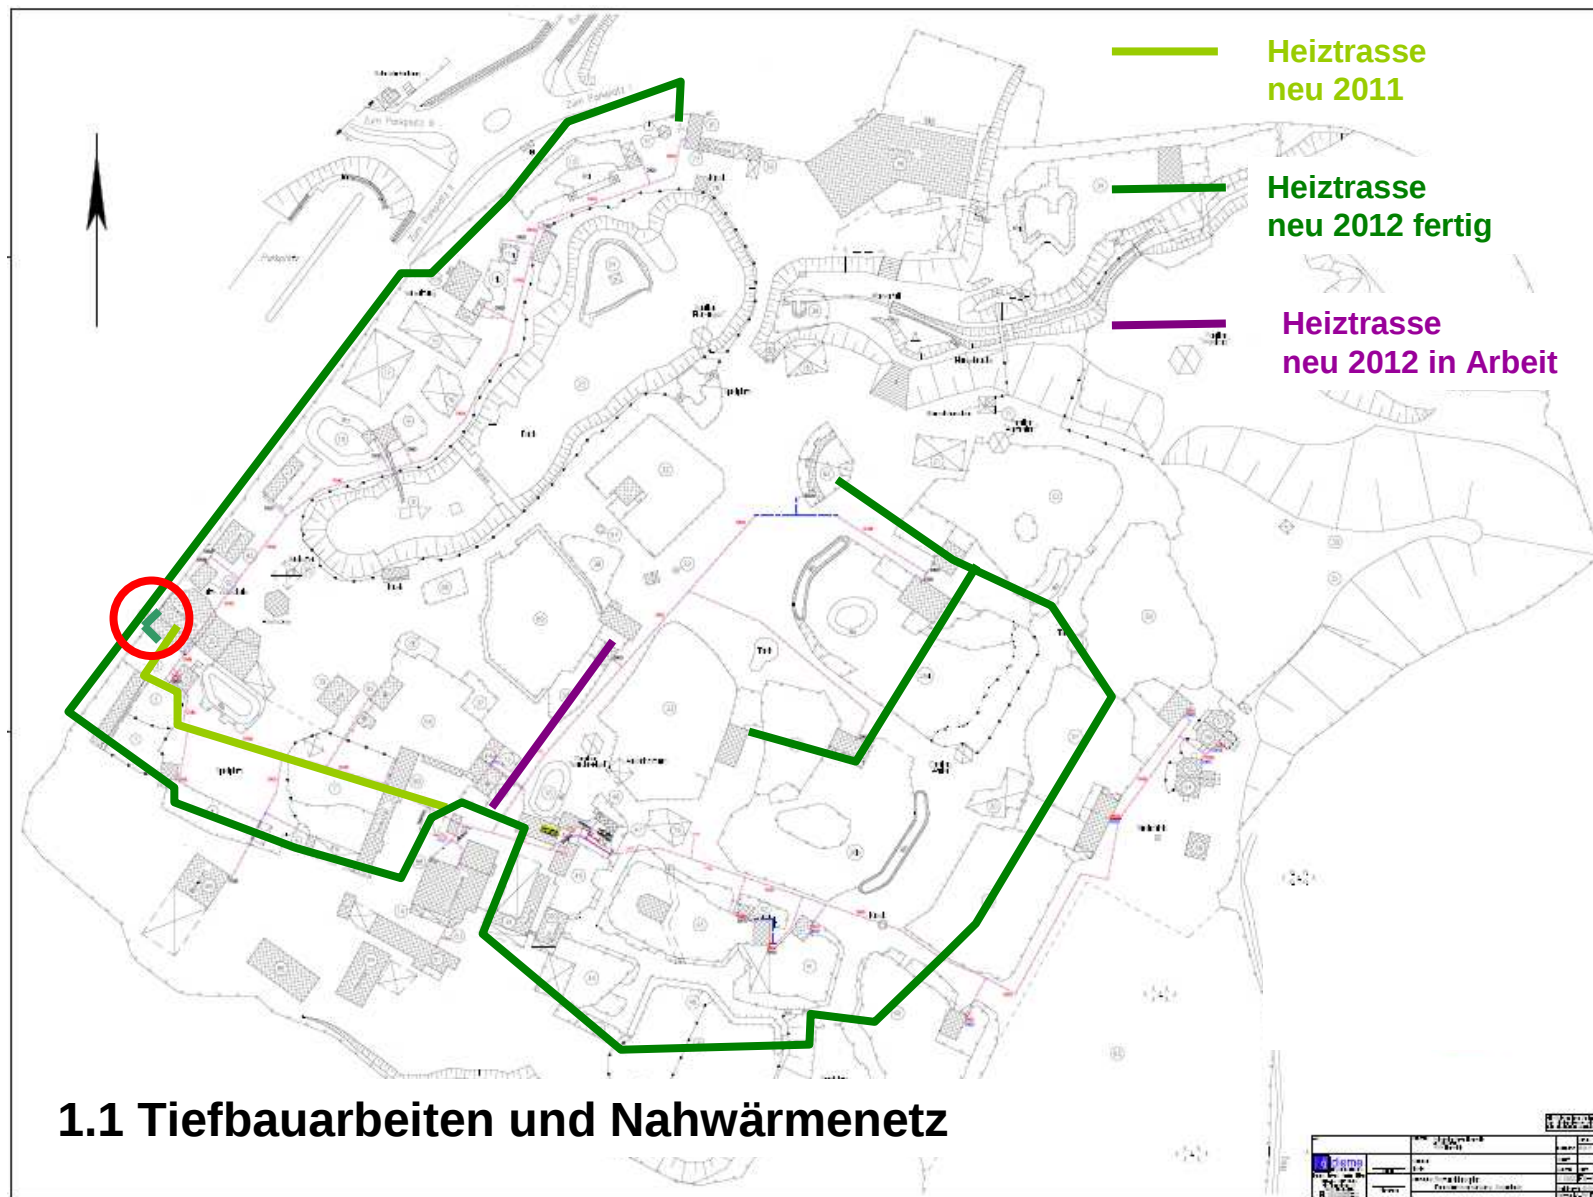

Abschluss der Erd- und Verlegearbeiten für das Nahwärmenetz am Freitag, den 14. September!



1.1 Tiefbauarbeiten und Nahwärmenetz

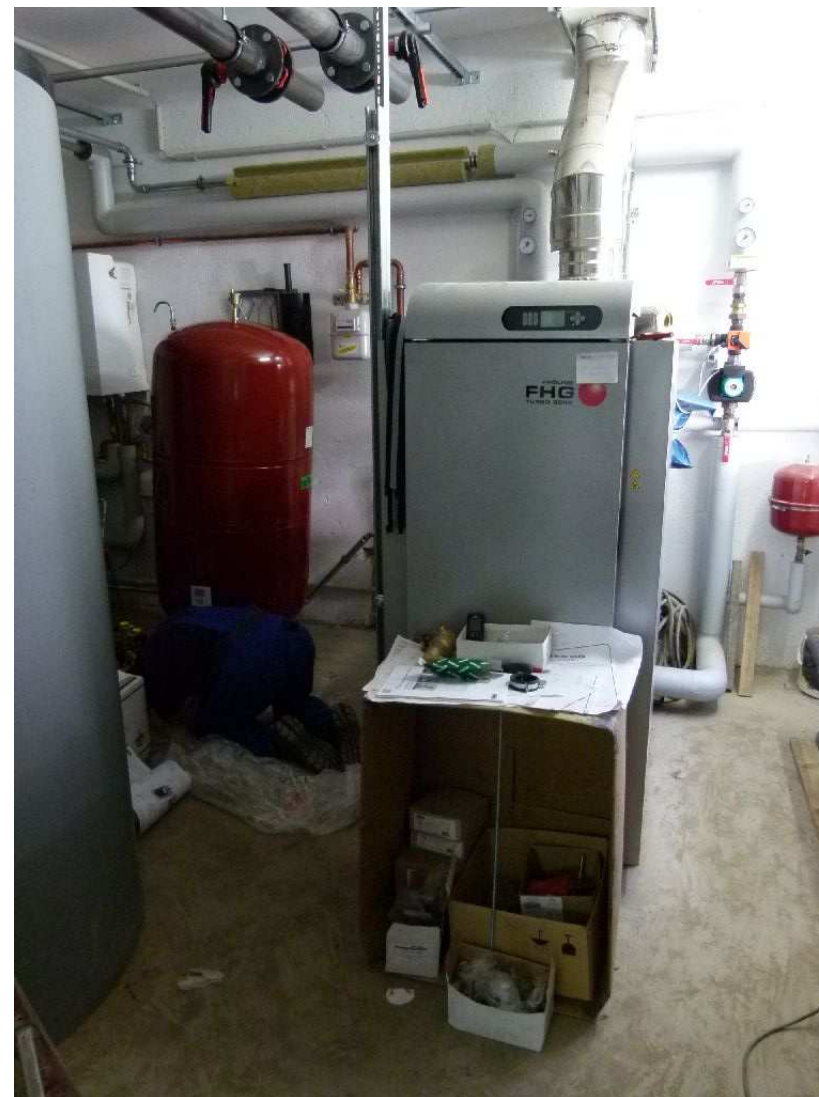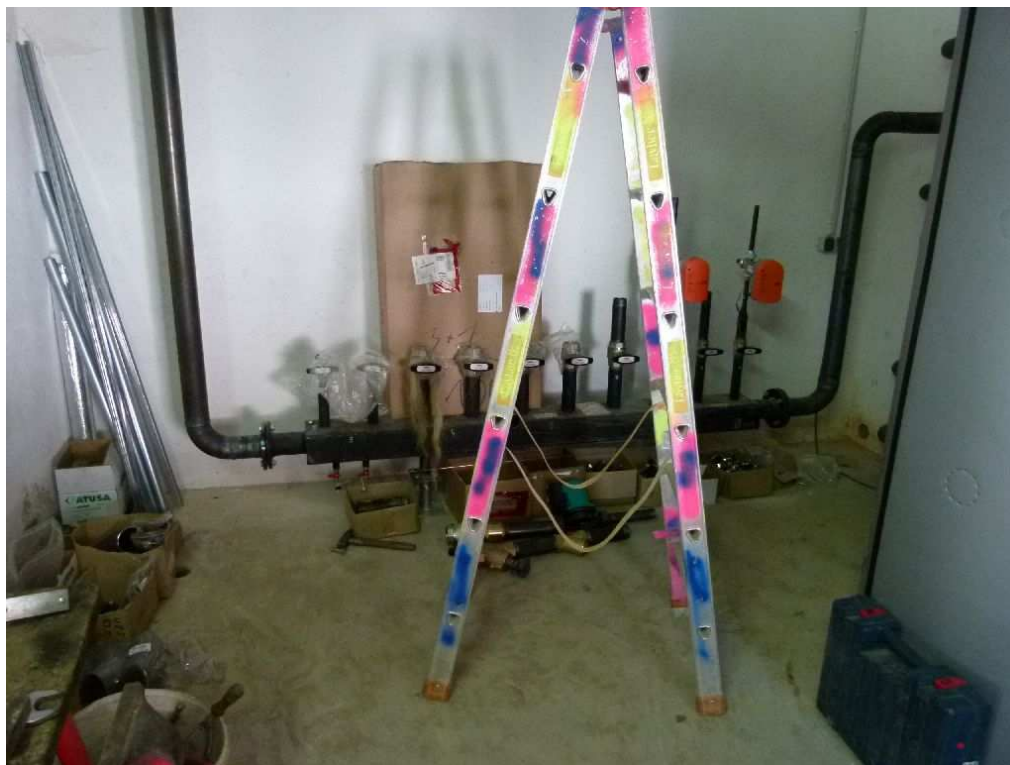

1.2 Heizzentrale

- **Die Installationsarbeiten laufen planmäßig, zur Zeit Verrohrung der Pufferspeicher und des Heizungsverteilers**
- **Lieferung BHKW 18. September**
- **Probetrieb mit BHKW und Scheitholzessel (zusammen 110 kW) ab dem 26. September**
- **Fundamente für Energiebox fertig**
- **Lieferung Energiebox und Pelletkessel am 10. Oktober**
- **Komplette Heizleistung voraussichtlich am 23. Oktober**

1.2 Heizzentrale



1.3 Gebäudeinstallation

- **Die wichtigsten Tierunterkünfte mit Heizkörpern ausgestattet und vollständig installiert, ca. 1/3**
- **Seit gestern Installationsarbeiten im Urwaldhaus bei laufendem Betrieb**
- **Kaum Beeinträchtigungen für Besucher, störende Arbeiten in den Morgenstunden**
- **Mit Abschluss der Arbeiten am Nahwärmesystem weitere Installateure für die Arbeiten in den Gebäuden zur Verfügung => deutliche Beschleunigung**

1.3 Gebäudeinstallation

Pellet-Kessel-Anlage



Alternatives BHKW XRGI 20



**Wir heizen den Zoo zu 100% mit erneuerbaren
Energien und Kraft-Wärmekopplung!**

Natürlich Eberswalde!

2. Technische Änderung

- **Keine Kostenerhöhungen seit den Vergabebeschlüssen im HA am 2. August**
- **Kleinere Nachträge jeweils mit Wegfall von Positionen kompensiert**
- **Unternehmen sehr kooperativ**
- **Prognose: derzeit keine Kostenerhöhungen zu erwarten**

3. Kostenentwicklung

- **Antrag am 26. Juni bei der ILB eingereicht**
- **Grundbuchauszug und amtlichen Flurkartenauszug nachgefordert**
- **Z. Z. technische Prüfung durch die ZAB
Zukunftsagentur Brandenburg GmbH**
- **Zwischenzeitlich Nachfragen, warum nicht
(vorrangige) Bundesförderungen beantragt werden**
- **Technische Daten BHKW abgefragt**
- **Keine ablehnende Haltung erkennbar**

4. Stand Förderantrag

Ende der Präsentation

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse
