

**B 167 Ortsdurchfahrt Eberswalde
Eisenbahnstraße zwischen
Puschkinstraße und Schwärzebrücke**



**Informationen
zum Stand der Bauarbeiten**

28.10/2013

05.11.2013

Übersicht



Folie vom 03.06.2013



Termine:

- | | | |
|------------|--|---------------------|
| S | ➤ Planung und Ausschreibungsunterlagen: | Januar 2013 |
| | ➤ Ausschreibung: | Februar 2013 |
| | ➤ Zuschlag: | 14.05. 2013 |
| | ➤ Baubeginn: | Juni 2013 |
| B 167 0280 | ➤ Nettobauzeit: | 183 Werktage |
| 11.05.2012 | | |

Stand der Bauarbeiten:

Ertüchtigung der Brunnenstraße:	10.06.2013 – 21.06.2013
Sperrung der Eisenbahnstr.:	24.06.2013
Brückenbauarbeiten	
Kanalbau	01.07.2013 – 07.11.2013
Borde	09.09.2013 – 07.11.2013
Asphalt	08.11.2013
Nebenanlagen	28.10.2013

**Massive Behinderungen des Bauablaufes
durch Versorgungsleitungen**





16/07/2013





12/09/2013




12/09/2013



16/07/2013

<p>STRABAG AG Direktion Berlin-Brandenburg Gruppe Neuenhagen</p> <p>STRABAG AG - Zum Erlenbruch 2-6 - 15395 Neuenhagen</p> <p>Landesbetrieb Straßenwesen Niederlassung Ost Nebensitz Eberswalde Tramper Chaussee 3 Haus 8 16225 Eberswalde</p>	<p>STRABAG</p> <p>Zum Erlenbruch 2-6 15395 Neuenhagen Telefon +49(0)3342/2398-45 Telefax +49(0)3342/2398-32 www.strabag.com</p> <p>Vorstand: Dr. Thomas Birfel, Dipl.-Ing. Jörg Escherbach, Dipl.-Ing. Peter Hübner, Mag. Marcus Keller, Dipl.-Kfm. Peter Kam, Dipl.-Ing. Jörg Rösler Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Jürgen Kuchemwald Stz der Gesellschaft: Köln HRB 556 USt-Id-Nr. DE122659503</p>										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Unser Zeichen</td> <td>Teil-Durchwahl</td> <td>Fax-Durchwahl</td> <td>e-mail</td> <td>Datum</td> </tr> <tr> <td>go</td> <td>-45</td> <td>-32</td> <td>manika.goldhammer@strabag.com</td> <td>25.07.2013</td> </tr> </table>		Unser Zeichen	Teil-Durchwahl	Fax-Durchwahl	e-mail	Datum	go	-45	-32	manika.goldhammer@strabag.com	25.07.2013
Unser Zeichen	Teil-Durchwahl	Fax-Durchwahl	e-mail	Datum							
go	-45	-32	manika.goldhammer@strabag.com	25.07.2013							
<p>Bauvorhaben: Eisenbahnstraße in Eberswalde, Sanierung Brücke über die Schwärze Vertrag vom: 14.05.2013 Behinderung gemäß § 6 Nr. 1 VOB/B</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>hiermit zeigen wir an, dass wir in der Ausführung unserer Leistungen behindert sind, da:</p> <ol style="list-style-type: none"> mit Datum vom 24.07.2013 der Medienbestand im Baufeld des 1. BA flächendeckend die Weiterführung der Kanalbauarbeiten verhindert. wegen fehlender Vorleistung im Kanalbau besteht für die Straßenbauarbeiten ab dem 26.07.2013 ebenfalls eine Behinderung im kompletten Baufeld. <p>Wir weisen darauf hin, dass hierdurch entstehende Verzögerungen und Mehrkosten zu Ihren Lasten gehen. Bis zur Vorlage einer Anordnung sind wir in den beschriebenen Baubereichen behindert, ausgenommen sind die Arbeiten am Brückenbauwerk über die Schwärze.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>STRABAG AG</p> <p> i. V. Maik Nauke  i. A. Marika Goldhammer</p> <p style="text-align: right;">20130725_Behinderung 2.doc</p>											
<p><small>Bankverbindung: Deutsche Bank AG, Berlin 19 19 19 0 (BLZ 150 700 00)</small></p> <p><small>USt-IdNr. DE122659503</small></p>											

<p>STRABAG AG Direktion Berlin-Brandenburg Gruppe Neuenhagen</p> <p>STRABAG AG - Zum Erlenbruch 2-6 - 15395 Neuenhagen</p> <p>Landesbetrieb Straßenwesen Niederlassung Ost Nebensitz Eberswalde Tramper Chaussee 3 Haus 8 16225 Eberswalde</p>	<p>STRABAG</p> <p>Zum Erlenbruch 2-6 15395 Neuenhagen Telefon +49(0)3342/2398-45 Telefax +49(0)3342/2398-32 www.strabag.com</p> <p>Vorstand: Dr. Thomas Birfel, Dipl.-Ing. Jörg Escherbach, Dipl.-Ing. Peter Hübner, Mag. Marcus Keller, Dipl.-Kfm. Peter Kam, Dipl.-Ing. Jörg Rösler Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Jürgen Kuchemwald Stz der Gesellschaft: Köln HRB 556 USt-Id-Nr. DE122659503</p>										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Unser Zeichen</td> <td>Teil-Durchwahl</td> <td>Fax-Durchwahl</td> <td>e-mail</td> <td>Datum</td> </tr> <tr> <td>go</td> <td>-45</td> <td>-32</td> <td>manika.goldhammer@strabag.com</td> <td>29.07.2013</td> </tr> </table>		Unser Zeichen	Teil-Durchwahl	Fax-Durchwahl	e-mail	Datum	go	-45	-32	manika.goldhammer@strabag.com	29.07.2013
Unser Zeichen	Teil-Durchwahl	Fax-Durchwahl	e-mail	Datum							
go	-45	-32	manika.goldhammer@strabag.com	29.07.2013							
<p>Bauvorhaben: Eisenbahnstraße Eberswalde Vertrag vom: 14.05.2013 Anmeldung von Bedenken gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>wir haben eine Mitteilungspflicht, sofern gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen Sicherung gegen Unfallgefahren) Bedenken bestehen. Dementsprechend melden wir unsere Bedenken gegen die Art der Ausführung an, die zu später auftretenden Mängeln und/oder Schäden führen kann. Dies begründen wir wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> die Kabeltrasse der Telekom ist auf Anweisung anzuheben und mit verdichtungsfähigem Boden zu unterfüllen. Ein fachgerechtes Verdichten ist nicht möglich (siehe Foto lt. Anhang). Es besteht die Gefahr von späteren Setzungen. <p>Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir in diesem Fall gemäß § 13 Nr. 3 VOB/B von der Gewährleistung aus den vorgenannten Gründen freigestellt sind.</p>											

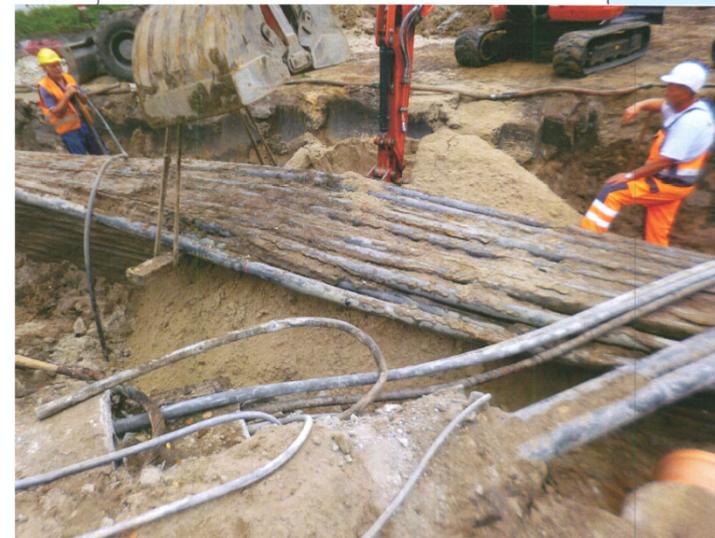


Weiterer Bauablauf:



Achtung

Bauzeiten ohne witterungsbedingte Unterbrechungen

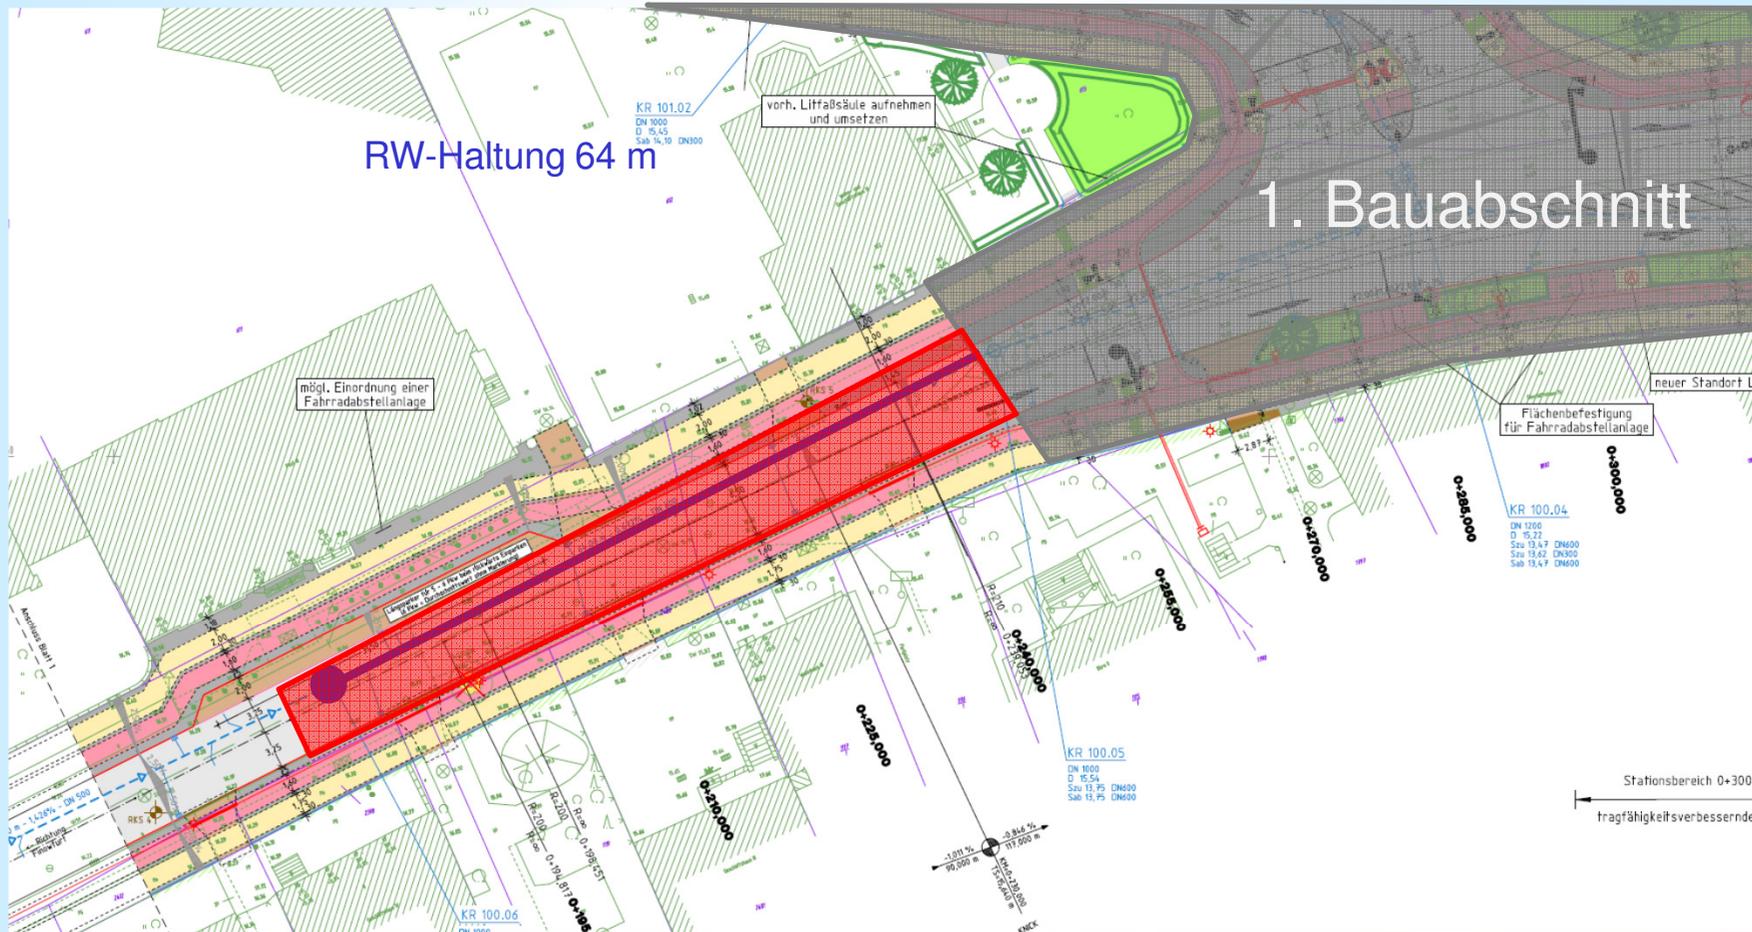

Zusammenfassung:

Baubeginn erfolgte planmäßig

Versorgungsleitungen führen zu Störungen des Bauablaufes

Fertigstellung 1. BA Januar 2014

Bauarbeiten werden im 2. BA so lange weitergeführt
bis Witterung keine Arbeiten zulässt.

→ Kein Durchgangsverkehr auf der Eisenbahnstraße bis zum Bauende

Bauende nicht vor Sommer 2014

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit



www.ls.brandenburg.de
hans-juergen.otte@ls.brandenburg.de
